


凯晨广场工程总控进度计划

标识号	任务名称	工期	开始时间	二〇〇五年												二〇〇六年											
				9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
1	前期准备工作	56 d	2004年10月1日	▶																							
2	测量钉桩	2 d	2004年10月1日	■																							
3	1#、3#、5#塔吊基础	9 d	2004年10月8日	■																							
4	1#、3#、5#塔吊安装	9 d	2004年10月23日	■																							
5	2#、4#、6#塔吊基础	17 d	2004年10月15日	■																							
6	2#、4#、6#塔吊安装	18 d	2004年11月8日	■																							
7	现场临水施工	31 d	2004年10月1日	■																							
8	现场临电施工	31 d	2004年10月1日	■																							
9	现场临时设施（临建）施工	34 d	2004年10月8日	■																							
10																											
11	总工期	735 d	2004年10月15日	▶																							
12	配合中冶地清土、浇筑垫层	11 d	2004年10月15日	■																							
13	结构施工（包括钢结构）	339 d	2004年10月25日	▶																							
14	混凝土结构施工	277 d	2004年10月25日	▶																							
15	地下室结构施工	168 d	2004年10月25日	▶																							
16	基础底板施工	62 d	2004年10月25日	▶																							
17	底板垫层、防水及保护层施工	27 d	2004年10月25日	■																							
18	基础底板施工	41 d	2004年11月15日	■																							
19	地下四层结构施工	31 d	2004年12月5日	■																							
20	地下三层结构施工	31 d	2004年12月20日	■																							
21	地下二层结构施工	31 d	2005年1月4日	■																							
22	春节休假	20 d	2005年2月4日	■																							
23	地下一层结构施工	46 d	2005年2月24日	■																							
24	地上主体结构施工	109 d	2005年4月11日	▶																							
25	F01层结构施工	10 d	2005年4月11日	■																							
26	F02层结构施工	9 d	2005年4月21日	■																							
27	F03层结构施工	9 d	2005年4月30日	■																							
28	F04层结构施工	8 d	2005年5月9日	■																							
29	F05层结构施工	8 d	2005年5月17日	■																							
30	F06层结构施工	8 d	2005年5月25日	■																							
31	F07层结构施工	8 d	2005年6月2日	■																							
32	F08层结构施工	8 d	2005年6月10日	■																							
33	F09层结构施工	7 d	2005年6月18日	■																							
34	F10层结构施工	7 d	2005年6月25日	■																							
35	F11层结构施工	7 d	2005年7月2日	■																							
36	F12层结构施工	7 d	2005年7月9日	■																							
37	F13层结构施工	7 d	2005年7月16日	■																							
38	设备层结构（结构封顶）	6 d	2005年7月23日	■																							
39																											
40	钢结构工程（含验收）	198 d	2005年3月15日	▶																							
41	钢结构构件制作	32 d	2005年3月15日	■																							
42	F04~F06层H~K/5~8轴和A~C/12~15轴钢桁架连桥安装	19 d	2005年6月18日	■																							
43	F04~F06层通廊钢桁架压型钢板楼面钢筋绑扎及混凝土浇筑	10 d	2005年7月7日	■																							
44	F09~设备层A~D/5~8轴和G~K/12~15轴钢桁架连桥安装	20 d	2005年7月29日	■																							
45	F12~设备层H~J/5~8轴和B~C/12~15轴钢桁架连桥安装	15 d	2005年8月18日	■																							
46	F09层以上通廊钢桁架压型钢板楼面钢筋绑扎及混凝土浇筑	25 d	2005年8月18日	■																							
47	屋面天窗钢索桁架安装	20 d	2005年9月2日	■																							
48	钢结构防火涂料施工	38 d	2005年8月20日	■																							

日期：2005年4月10日

任务 关键任务 里程碑 摘要

凯晨广场工程总控进度计划

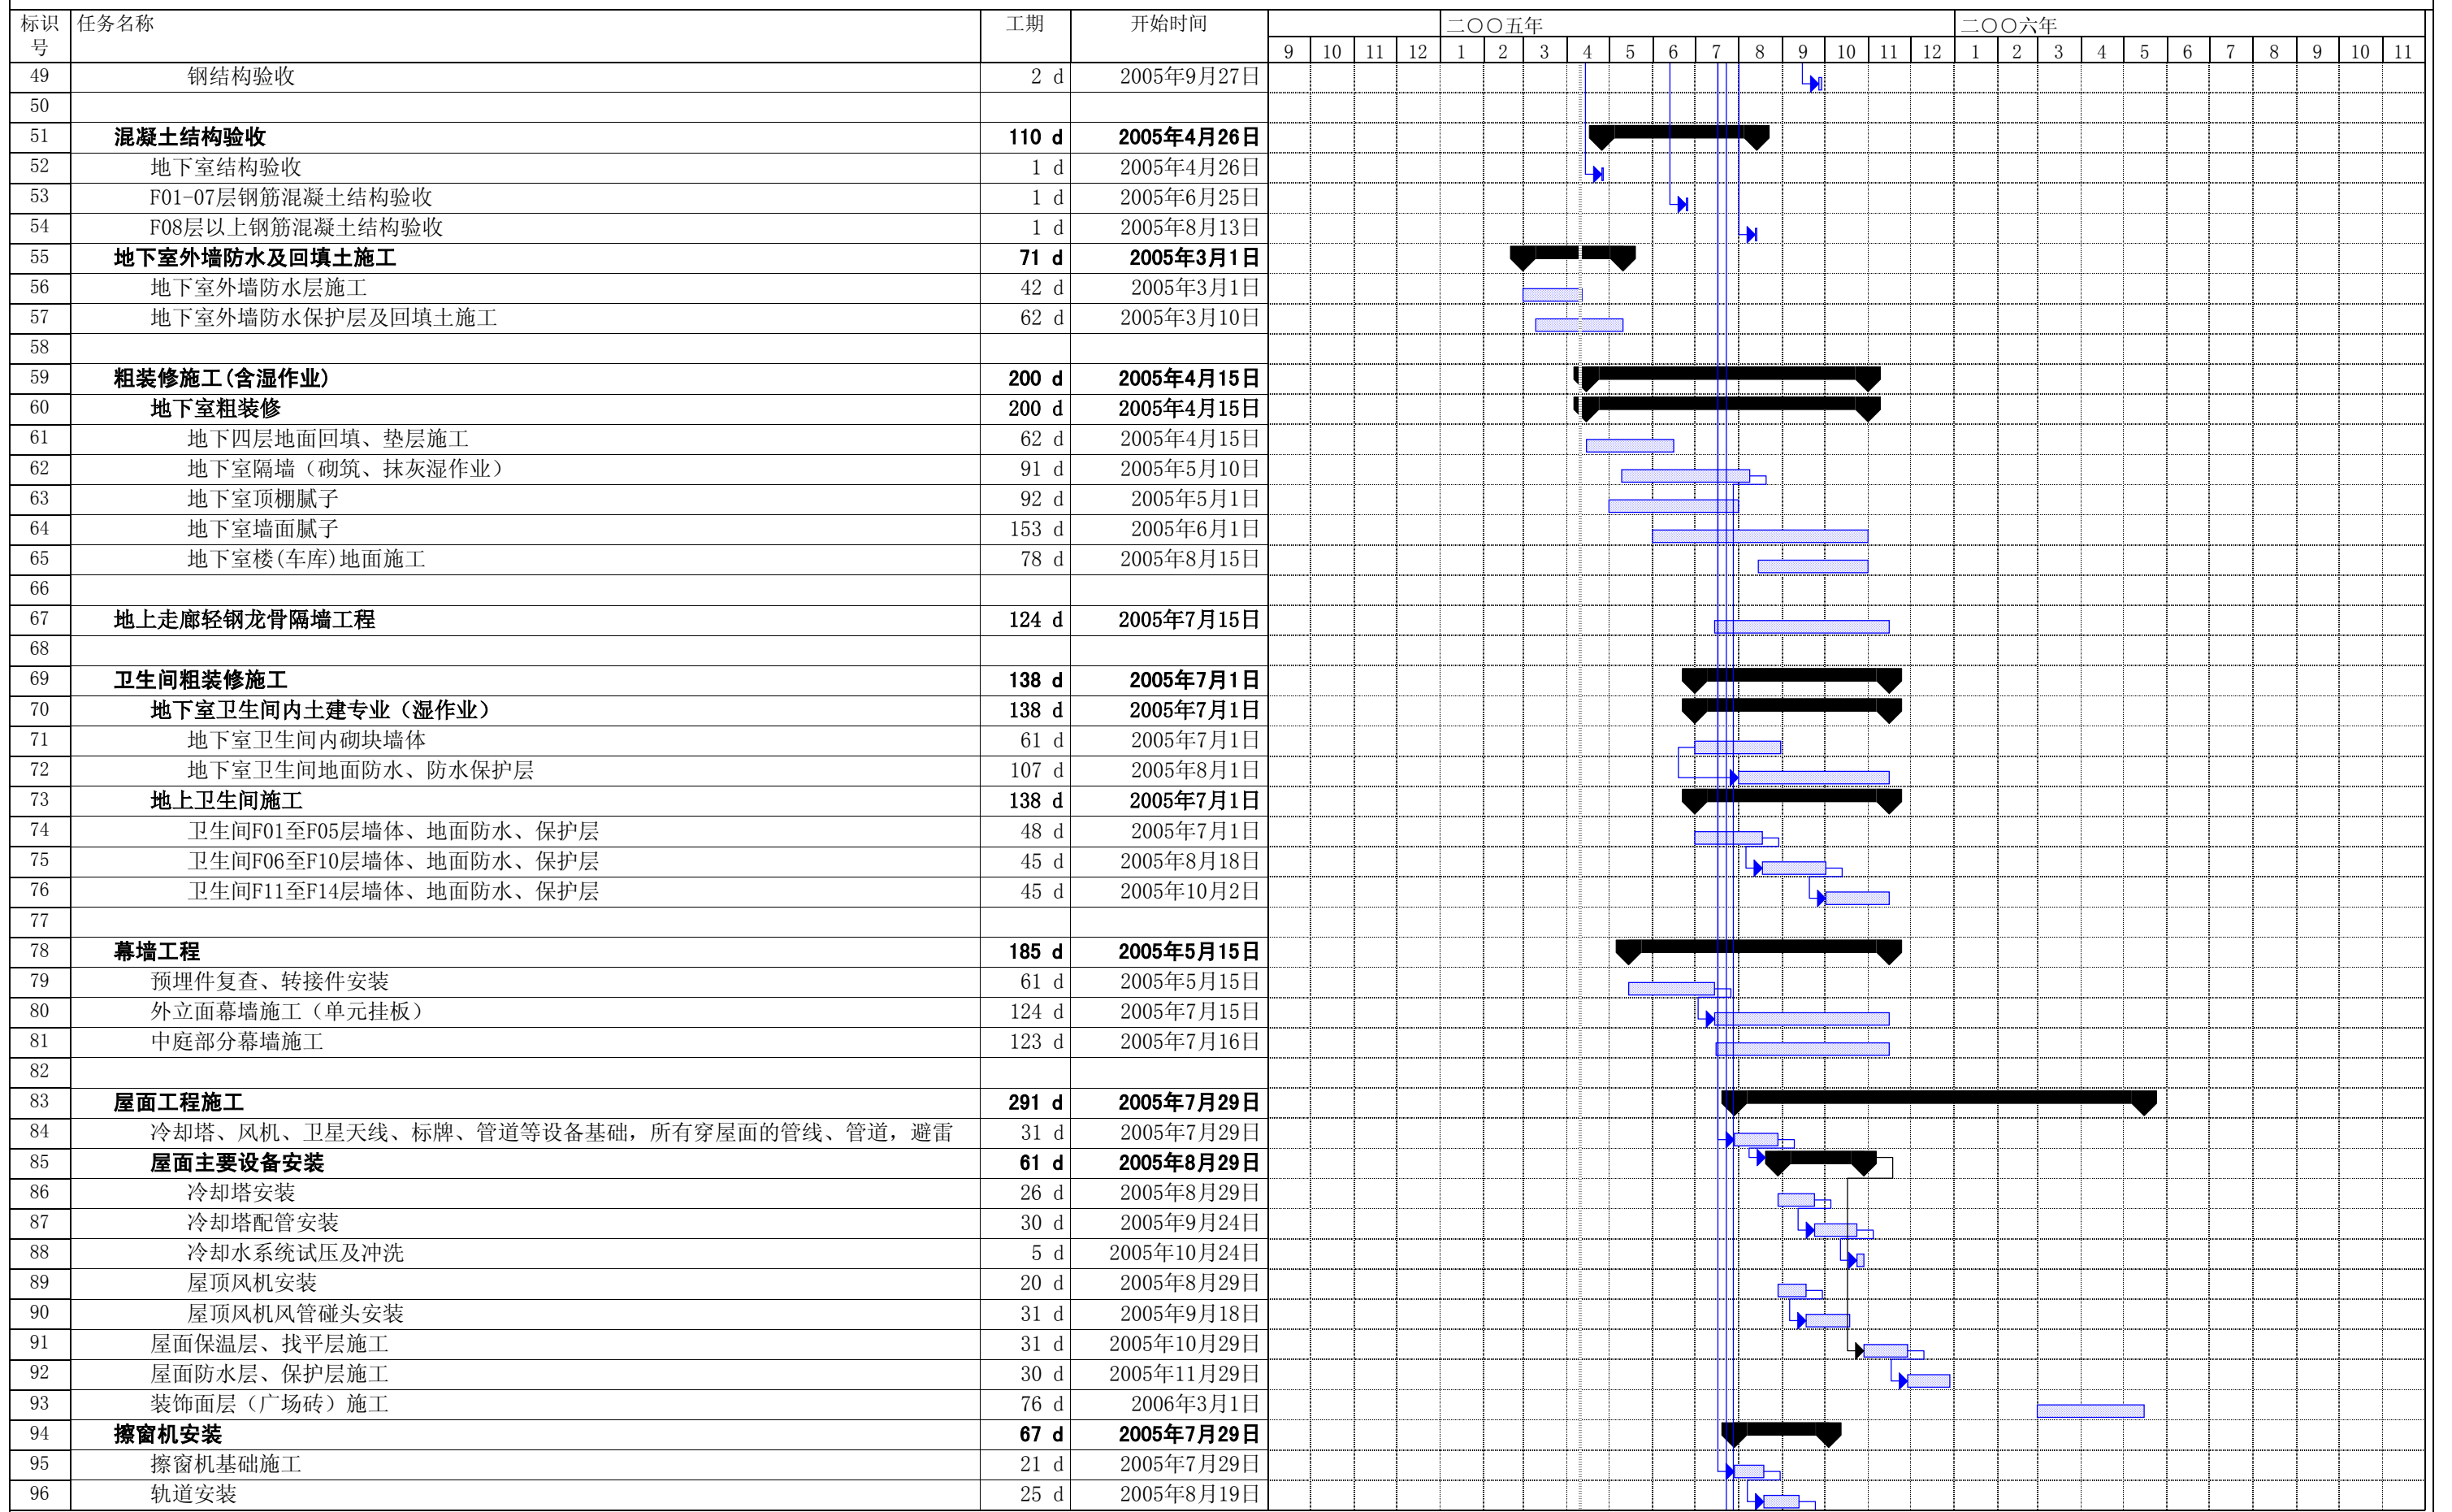

日期: 2005年4月10日

任务 关键任务 里程碑 摘要


凯晨广场工程总控进度计划

标识号	任务名称	工期	开始时间	二〇〇五年												二〇〇六年													
				9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97	设备安装	21 d	2005年9月13日																										
98	塔吊拆除	45 d	2005年9月1日																										
99	1#、3#、5#塔吊拆除	10 d	2005年9月1日																										
100	2#、4#、6#塔吊拆除	15 d	2005年10月1日																										
101	防火门安装	99 d	2005年8月9日																										
102	地下室防火卷帘门、钢质防火门框安装	63 d	2005年8月9日																										
103	地上钢质防火门和木制防火门框安装	93 d	2005年8月15日																										
104	消防楼梯前室、楼梯间装修	91 d	2006年4月1日																										
105																													
106	电梯工程（含调试）	153 d	2005年8月4日																										
107																													
108	机电预留预埋工程	261 d	2004年11月10日																										
109	机电工程	728 d	2004年10月15日																										
110	地下部分	698 d	2004年10月15日																										
111	春节放假	22 d	2006年1月24日																										
112	建筑电气	668 d	2004年10月15日																										
113	地下四层沿吊顶明配管敷设	35 d	2005年5月1日																										
114	地下四层二次结构内配管	35 d	2005年5月11日																										
115	地下四层桥架、线槽敷设	42 d	2005年6月10日																										
116	地下三层沿吊顶明配管敷设	35 d	2005年5月26日																										
117	地下三层二次结构内配管	35 d	2005年6月5日																										
118	地下三层桥架、线槽敷设	42 d	2005年6月20日																										
119	地下二层沿吊顶明配管敷设	35 d	2005年6月20日																										
120	地下二层二次结构内配管	35 d	2005年6月30日																										
121	地下二层桥架、线槽敷设	42 d	2005年7月10日																										
122	地下一层沿吊顶明配管敷设	40 d	2005年7月15日																										
123	地下一层二次结构内配管	40 d	2005年7月25日																										
124	地下一层桥架、线槽敷设	50 d	2005年8月14日																										
125	等电位安装	60 d	2004年10月15日																										
126	配电箱体安装	95 d	2005年9月13日																										
127	竖井内桥架、线槽敷设	60 d	2005年10月3日																										
128	电缆、电线敷设	145 d	2005年10月18日																										
129	线路并线、配电箱柜接线及电缆压接	95 d	2006年1月11日																										
130	插接母线安装	75 d	2006年1月11日																										
131	线路绝缘摇测	30 d	2006年4月16日																										
132	电气末端设备安装	90 d	2006年4月26日																										
133	系统调试	20 d	2006年7月25日																										
134	通风、空调	500 d	2005年5月1日																										
135	风管制作	234 d	2005年5月1日																										
136	地下四层水平风管安装	60 d	2005年5月21日																										
137	地下三层水平风管安装	60 d	2005年7月10日																										
138	地下二层水平风管安装	60 d	2005年8月29日																										
139	地下一层水平风管安装	80 d	2005年10月18日																										
140	空调机组安装	30 d	2005年10月18日																										
141	风机、诱导风机安装	60 d	2006年1月6日																										
142	地下三层空调水主管安装	45 d	2005年7月30日																										
143	空调水立管安装	45 d	2005年9月13日																										
144	地下一层空调水平主管安装	40 d	2005年10月28日																										

日期：2005年4月10日

任务 关键任务 里程碑 摘要


凯晨广场工程总控进度计划

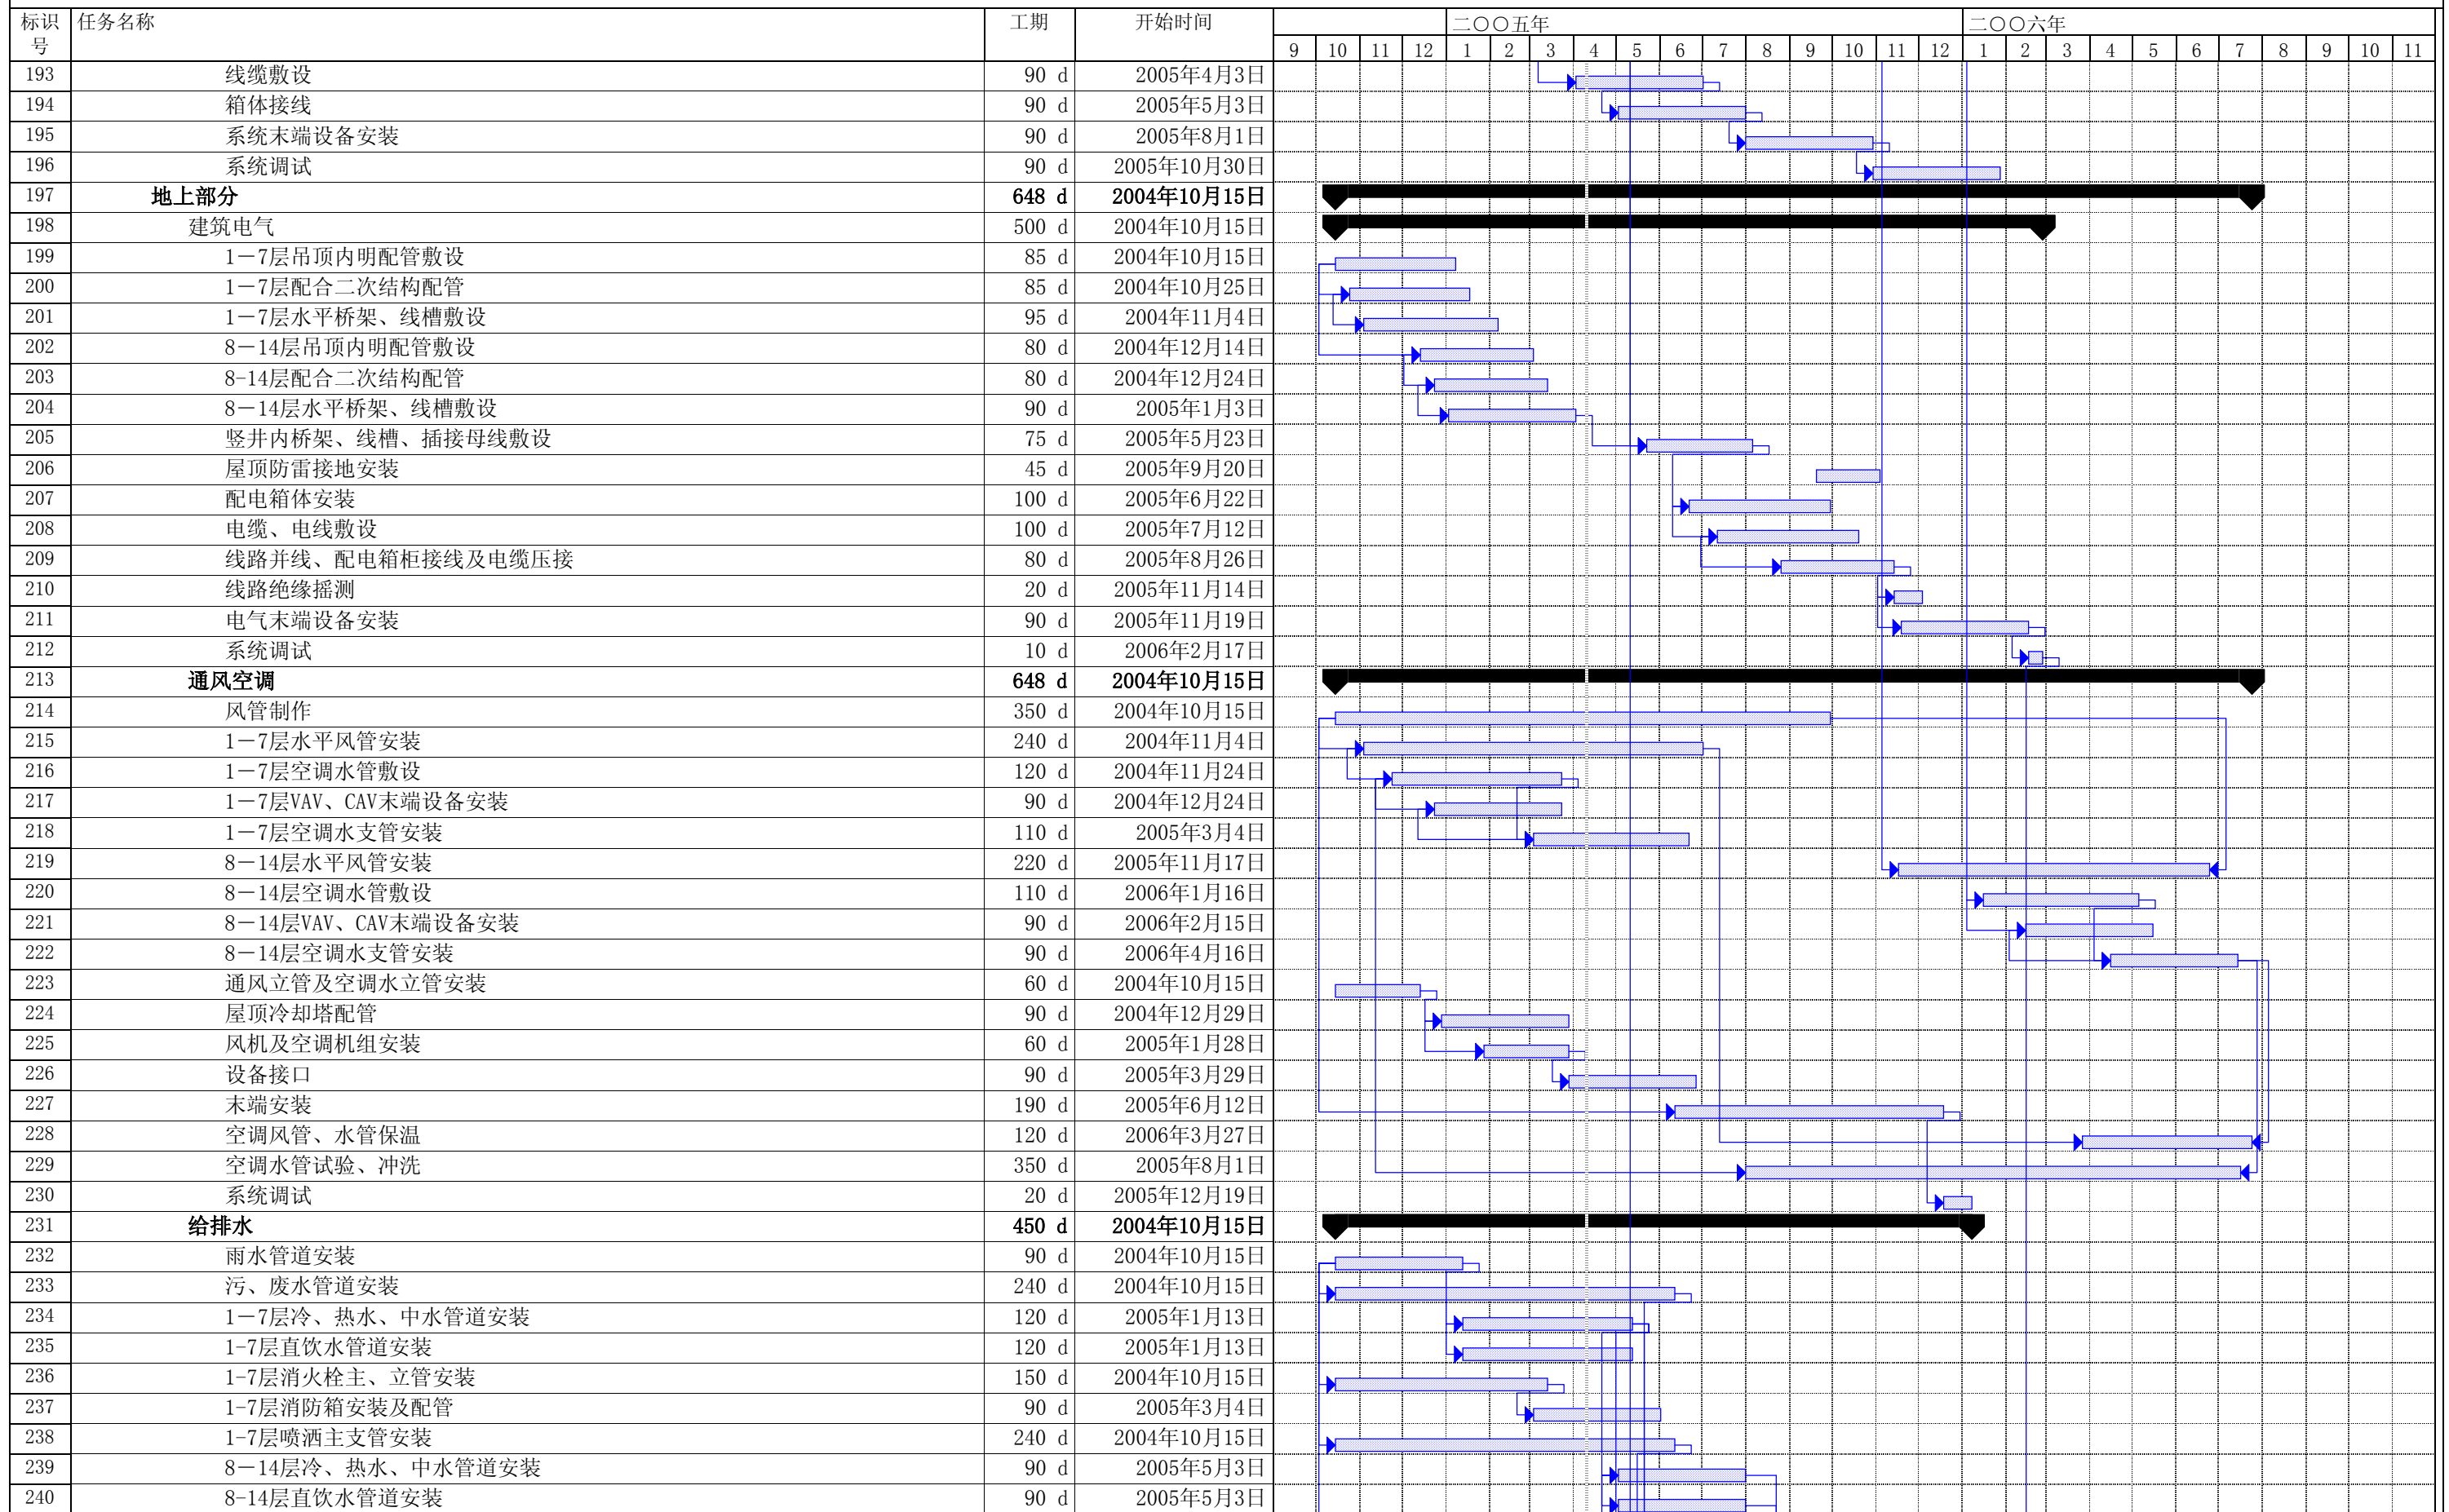

日期: 2005年4月10日

任务 ■ 关键任务 ■ 里程碑 ◆ 摘要 ▶

凯晨广场工程总控进度计划

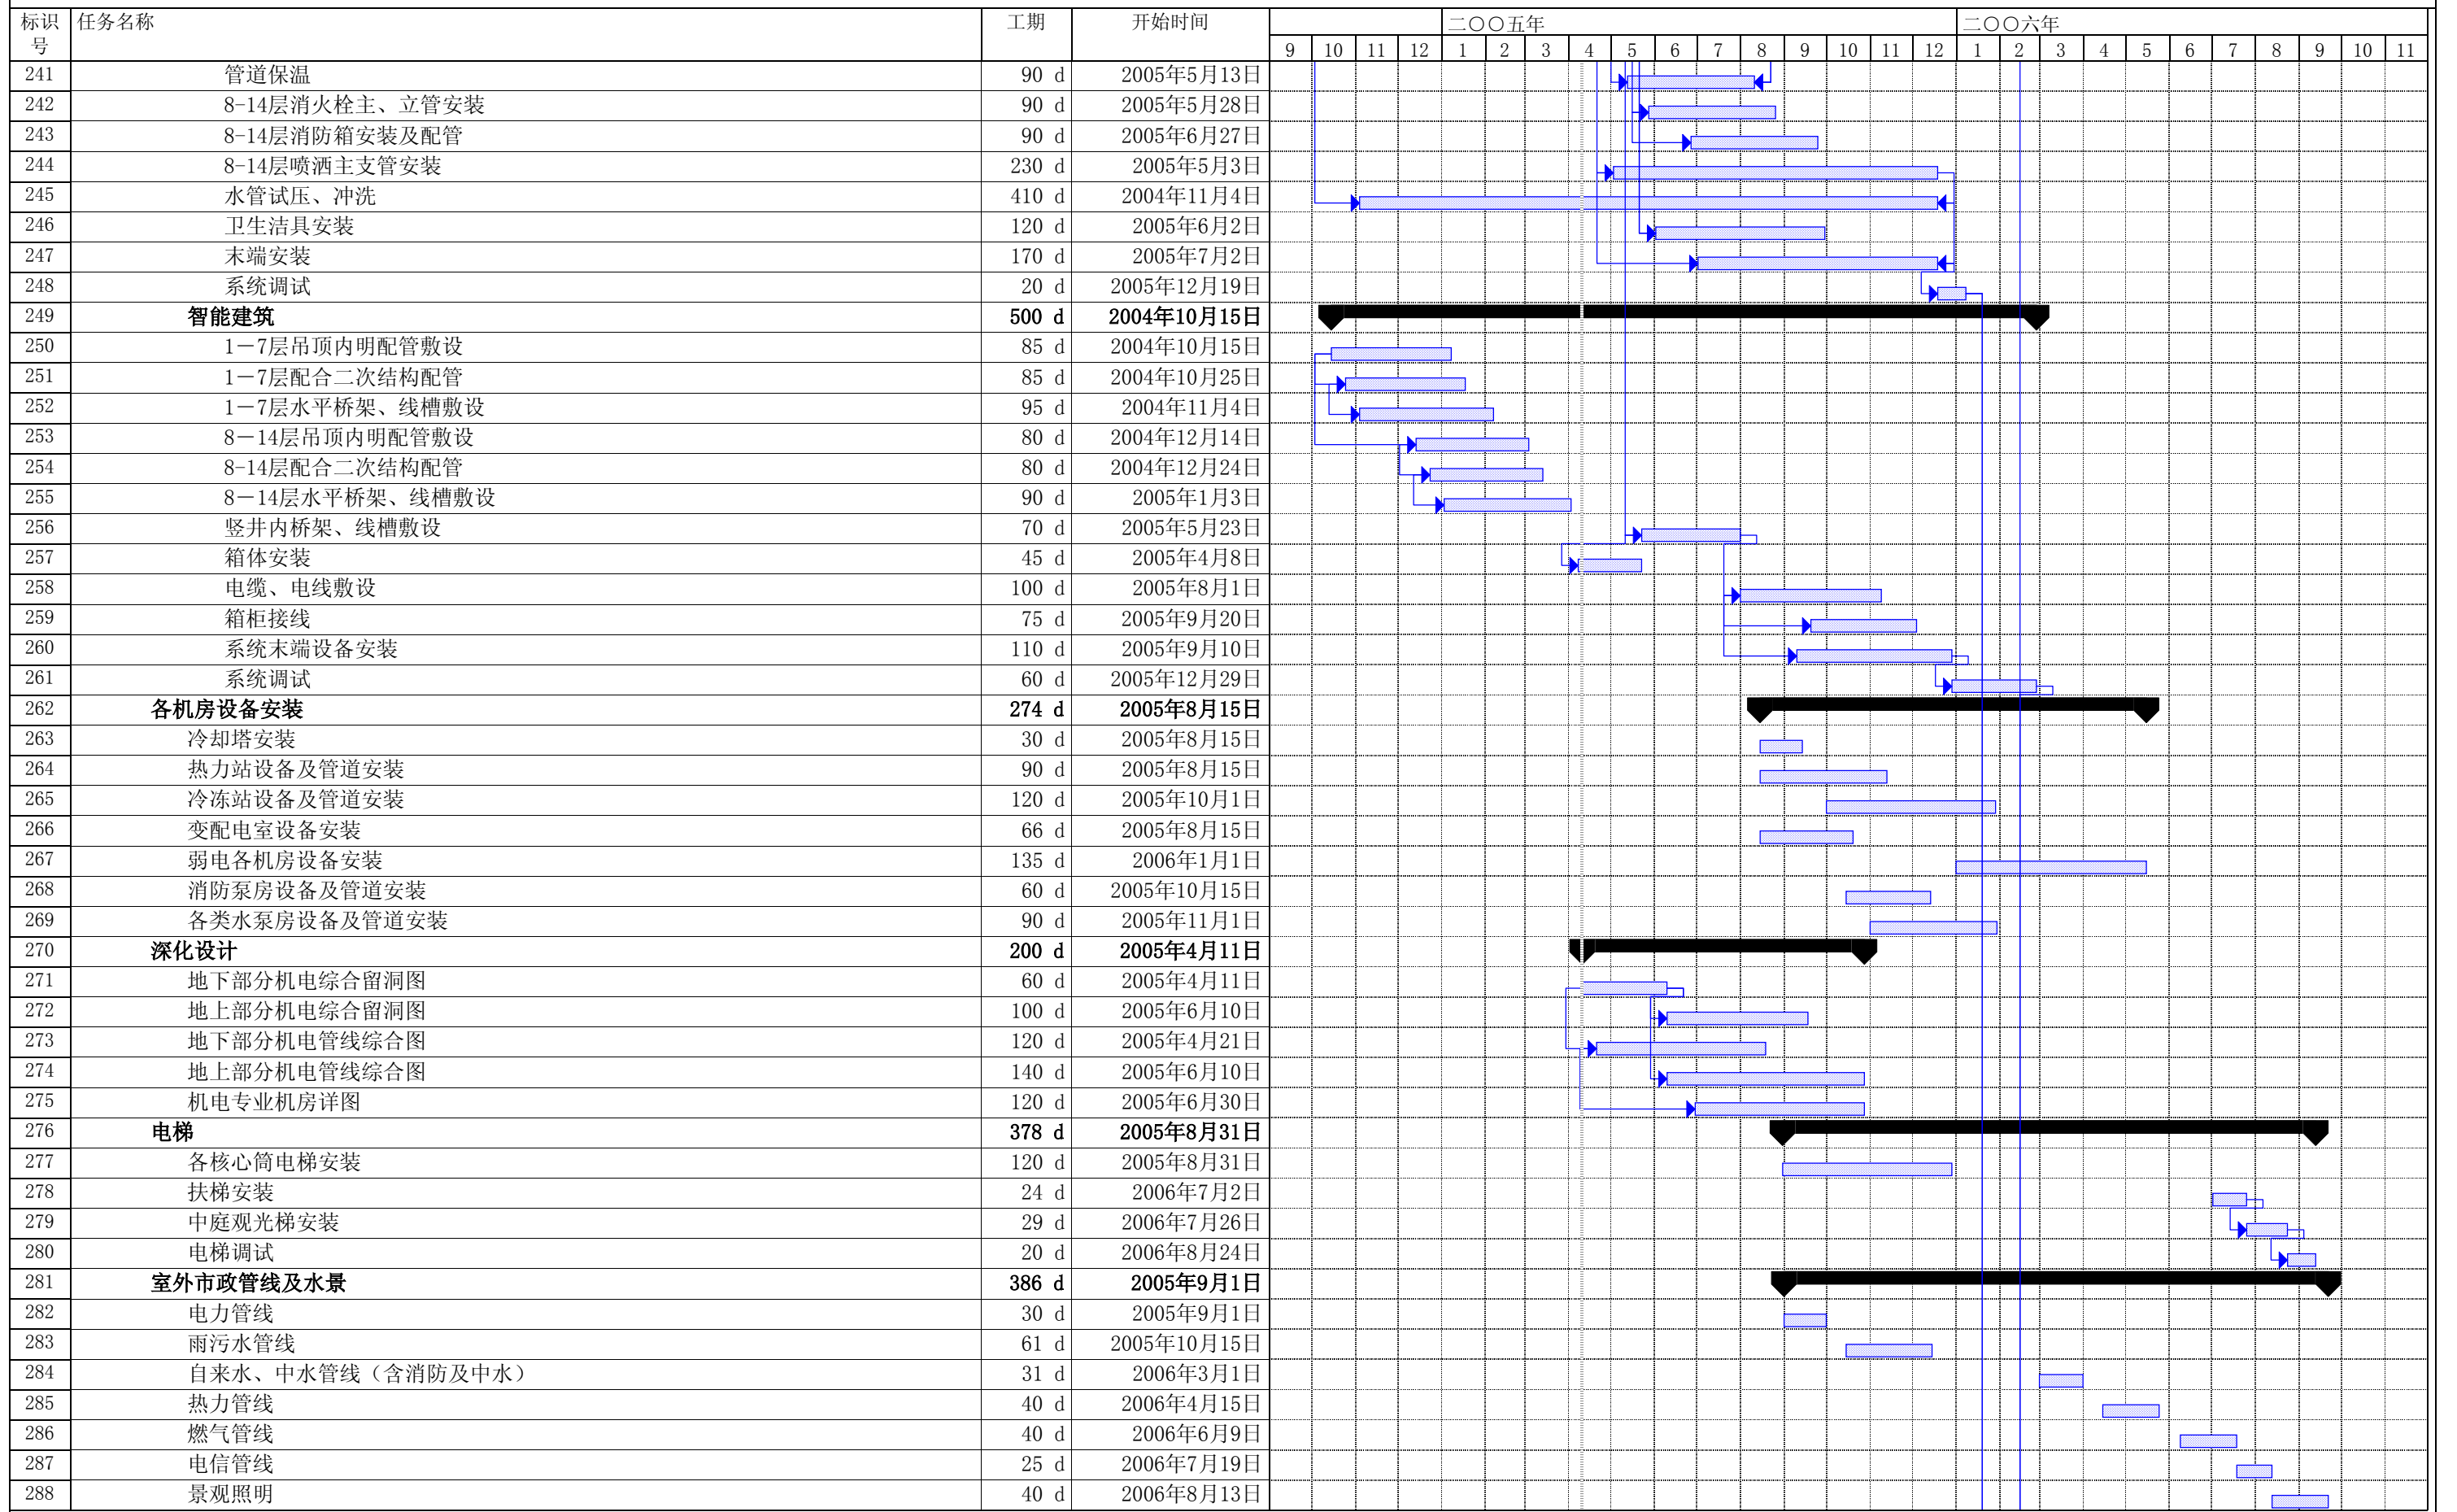

日期：2005年4月10日

任务 关键任务 里程碑 摘要

